

## Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2024
Objektnr. / Projekt	15-1 / John-F.-Kennedy-Schule, Münster _ Modulbau
Projektleitung	Kai Trietsch
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

### PROJEKTSTATUS

Die Tiefbauarbeiten wurden im Januar 2024 abgeschlossen. Im Februar 2024 wurde mit den Fundamentierungsarbeiten begonnen, die derzeit noch ausgeführt werden.

### PROJEKTÄNDERUNG

-/-

### PROJEKTAUSBLICK

Durch erforderlich gewordene Nacharbeiten an den Schraubfundamenten und verzögerte Lieferung durch das Generalunternehmen, verschieben sich die Termine. Der Beginn der Modulmontage ist für 06/2024 geplant. Voraussichtlich kann das Gebäude nach den Winterferien 24/25 in Betrieb genommen werden.

### PROJEKTKOSTEN

	Finanzmittel (€)		Kostensteuerung (€)	
	genehmigtes Budget*	geplantes Gesamtbudget*	Prognose (alt)	Prognose (neu)
KG 100				
KG 200			320.000	320.000
KG 300			7.500.000	7.010.000
KG 400			2.650.000	2.450.000
KG 500			1.350.000	1.350.000
KG 600				
KG 700			1.500.000	2.000.000
<b>Summe</b>	<b>12.300.000</b>	<b>12.300.000</b>	<b>13.320.000</b>	<b>13.130.000</b>

\* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan



Baufeld



Außenanlageplan



Ansichten


## Projektstatusbericht



Quartal / Jahr	01 / 2024
Objektnr. / Projekt	15-1 / John-F.-Kennedy-Schule, Münster _ Modulbau
Projektleitung	Kai Trietsch
Architekt / in	werk.um architekten, Darmstadt

### PROJEKTTERMINE

Planungsbeginn	03/2022
Abschluss Lph 3	02/2023
Einreichung Bauantrag	04/2023
Montagebeginn Gebäude	06/2024
Fertigstellung / Übergabe Nutzende	01/2025
Fertigstellung Außenanlage	01/2025

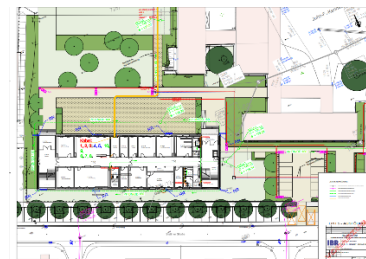

Tiefbauplanung



Gründung



Fundamentierungsarbeiten
